

# 梧州学院基建攻坚指挥部

## 简 报

基建攻坚指挥部办公室

2023 年 6 月

### 【项目进度】

#### （一）北片区项目 2023 年 6 月进展情况

##### 1. 设计完成情况：

北片区初步设计已报自治区发改委审批；已取得北片区三期的施工许可证。



（1#综合教学楼、1#实验实训楼及 1#阶梯教室鸟瞰图）

##### 2. 施工情况：

截止 2023 年 6 月底，1#综合教学楼、1#阶梯教室已交付使用；1#实验实训楼、7#职业培训楼已达到交付使用的标准；三期室外田径运动场跑道水稳层的施工基本完成，即将开展沥青铺设工作。

其中：

1#综合教学楼：完成了报告厅屋面渗漏水部位的排查，计划暑假期间进行整改。

1#阶梯教室：开展对钢梁锈蚀、屋面天沟渗漏水、电动玻璃天窗漏水的处理工作。

1#实验实训楼：北楼货梯的安装已完成 30%；中楼客梯的安装已完成 90%。

7#职业培训楼：开展毛石挡土墙的砌筑和玻璃雨棚安装工作。

室外田径运动场：田径场的周边围网已完成；跑道水稳层已完成 90%；田径场周边石砌台阶的石材铺装已完成 50%。

体育场看台及附属用房：完成了看台台阶抹灰、看台外墙贴砖、钢结构顶棚与看台的焊接等工作，目前正在实施补刷钢结构防锈漆工作；附属用房待质安站的检测编号对其桩基进行静载检测，完成检测后方可进行上架主体施工。

垃圾站：垃圾站的片石挡土墙砌筑已完成。

一期维修：7#职业培训楼及食堂外窗缺耐候胶的数量及部位进行排查和统计，计划在暑假期间完成补胶工作；已完

成 1#、2#宿舍卫生间二次排水的整改，剩余部分学生宿舍的  
整改计划在暑假期间完成。




(一期鸟瞰图)




(食堂综合楼鸟瞰图)




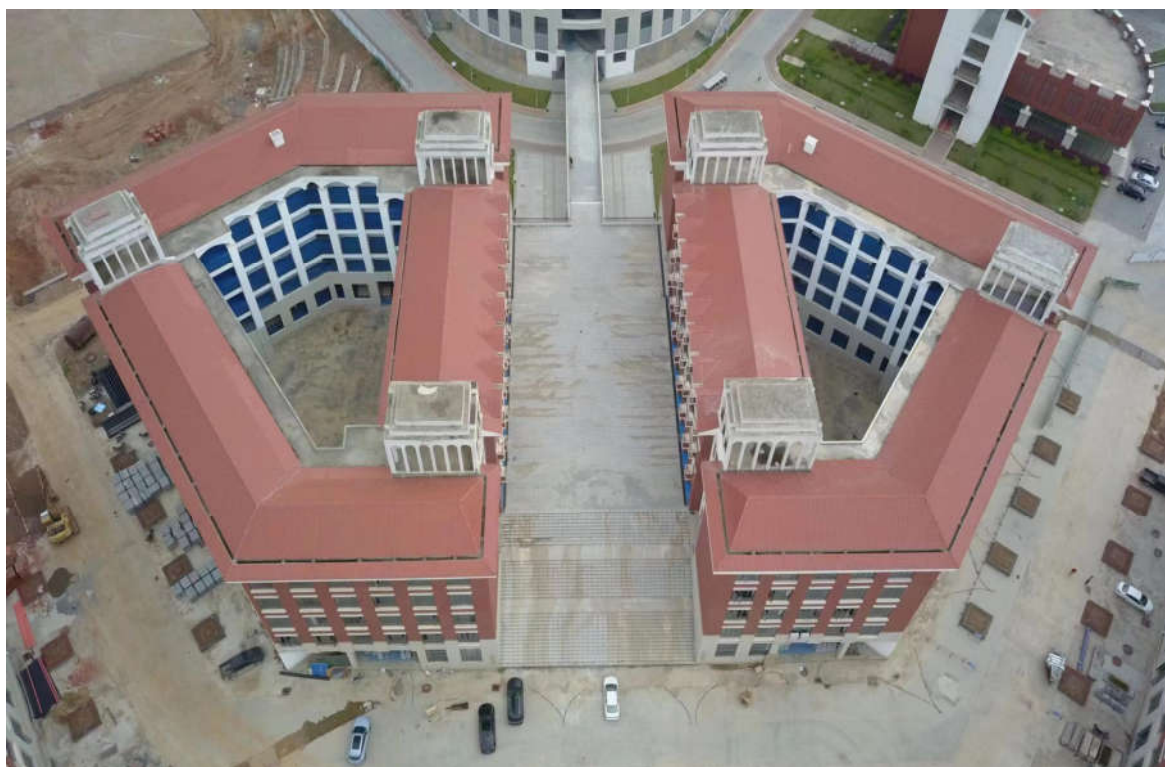

(二期 1#综合教学楼施工鸟瞰图)

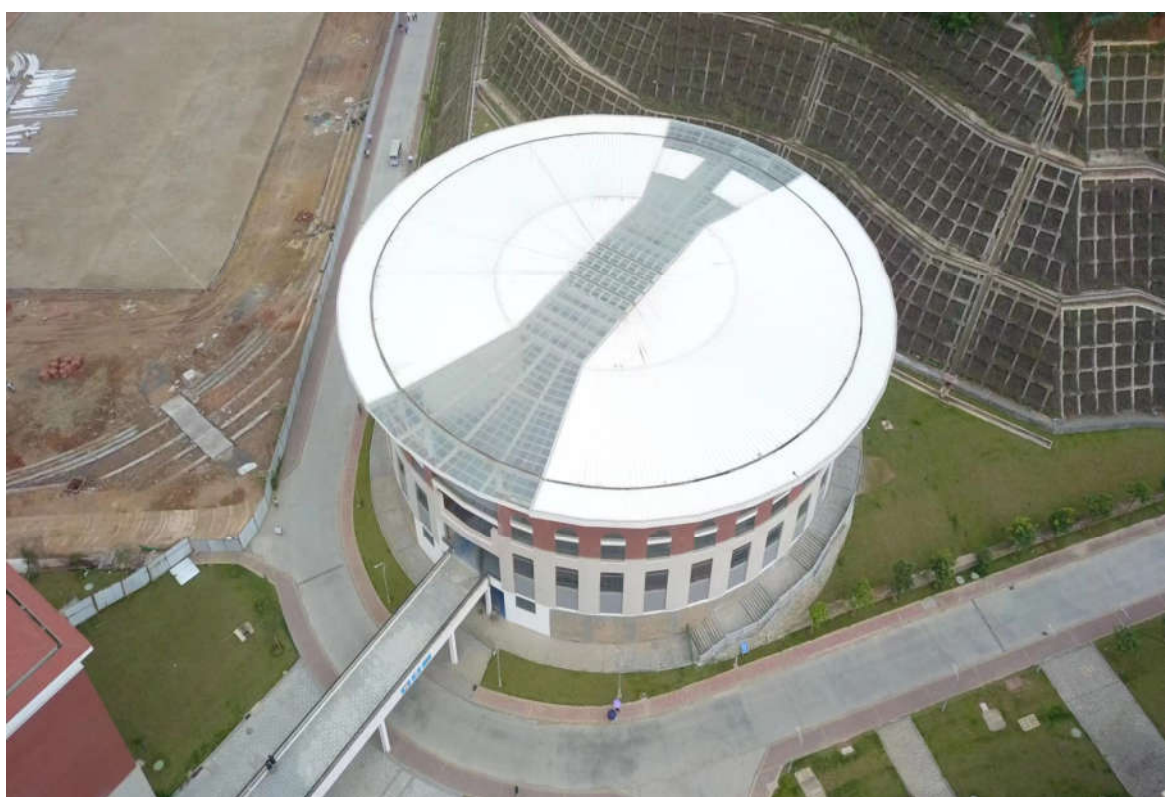

(二期 1#阶梯教室施工鸟瞰图)

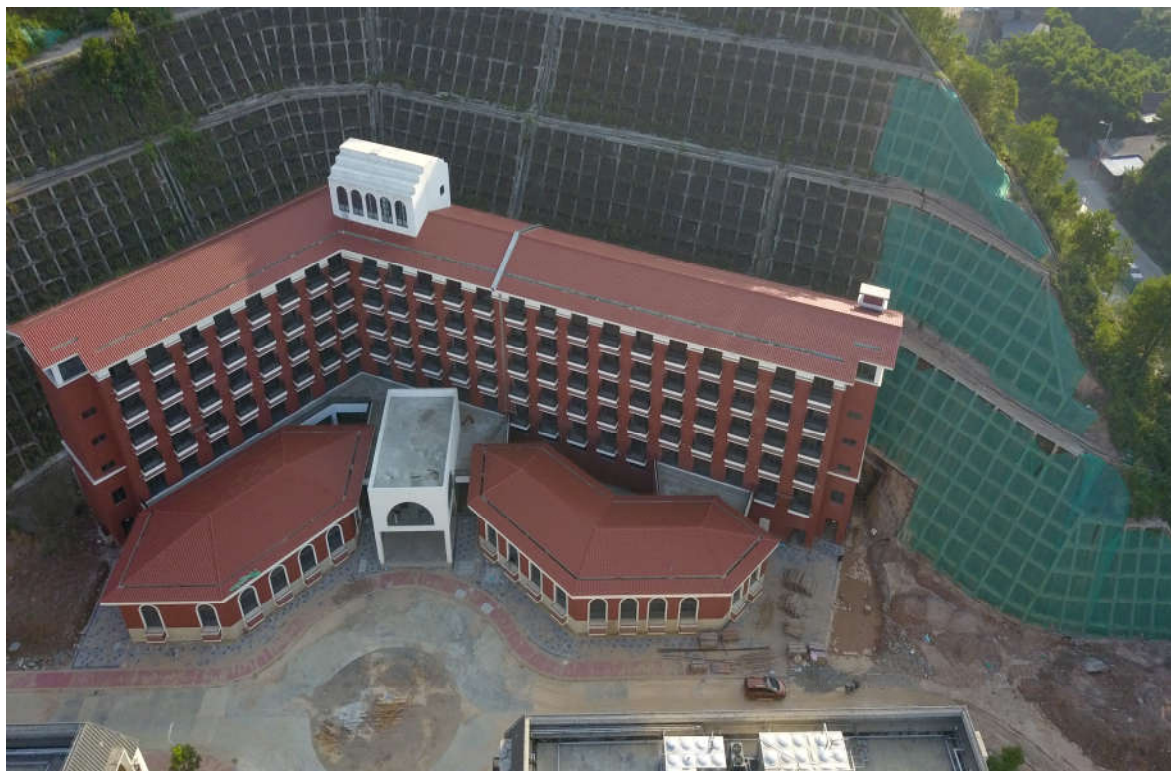

(三期 7#职业培训楼施工鸟瞰图)



(三期室外运动场及体育看台的施工鸟瞰图)

3. 截止 2023 年 6 月 30 日，本项目累计完成建安产值约 5.73 亿元，已付承包方工程进度款约 4.69 亿元（包含设计费 10108620 元）。
