

# 梧州学院基建攻坚指挥部

## 简 报

基建攻坚指挥部办公室

2023 年 12 月

### 【项目进度】

#### （一）北片区项目 2023 年 12 月进展情况

##### 1. 设计完成情况：

北片区初步设计已报自治区发改委审批，项目一、二、三期施工许可证办理全部完成。



（1#综合教学楼、1#实验实训楼及 1#阶梯教室鸟瞰图）

## 2. 施工情况：

截止 2023 年 12 月 31 日，1#综合教学楼、1#阶梯教室、1#实验实训楼、7#职业培训楼、室外田径运动场及看台已交付使用。其中：

体育场看台的附属用房：看台南侧附属用房主体结构、砌体及抹灰的施工已完成；装饰、装修完成了 50%；北侧附属用房主体结构及砌体的施工已完成，抹灰施工完成了 80%。

东北门：砌体及抹灰的施工已完成，外墙贴砖已完成 80%，屋面盖瓦已完成 30%。

垃圾站：完成了主体结构及砌体的施工。

室外工程：1#实验实训楼前的树池贴砖已完成；7#职业培训楼的室外道路施工已完成，室外铺装完成了 30%。

围墙：东侧围栏基础和北面围墙施工已完成，即将实施铁艺栏杆的安装。

验收情况：完成了消防验收意见问题的整改工作，等待主管部门的验收合格批复。




(一期鸟瞰图)




(食堂综合楼鸟瞰图)



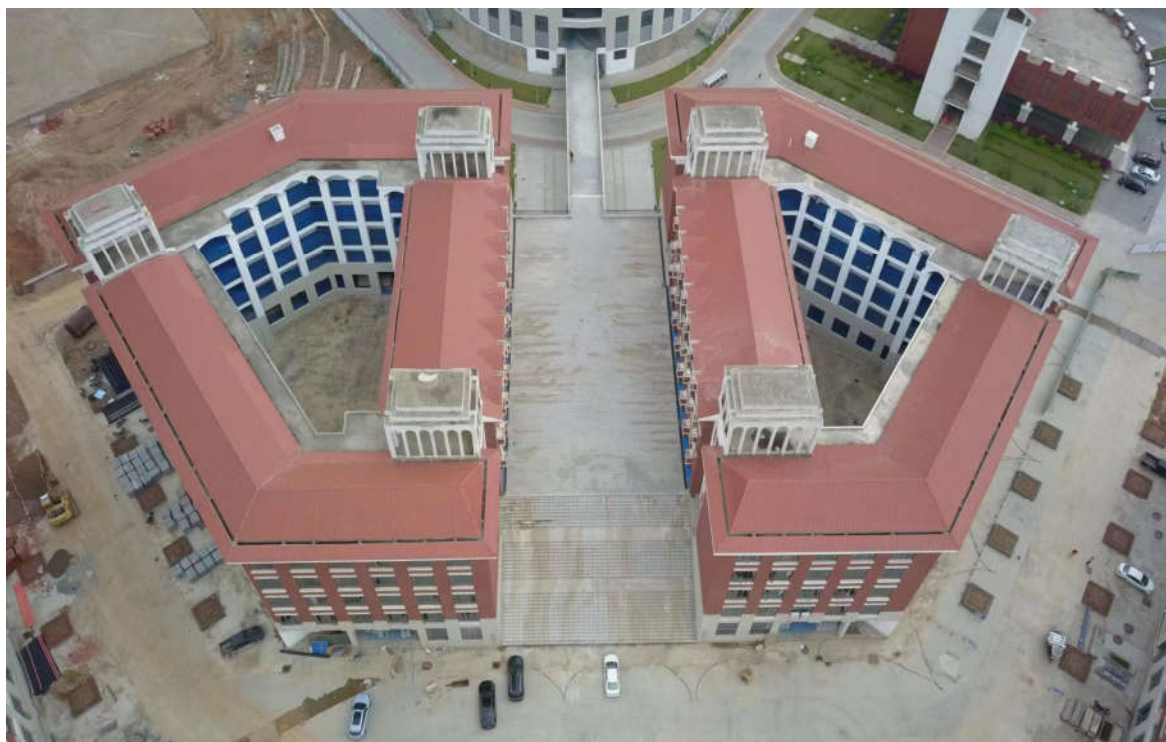

(二期 1#综合教学楼施工鸟瞰图)

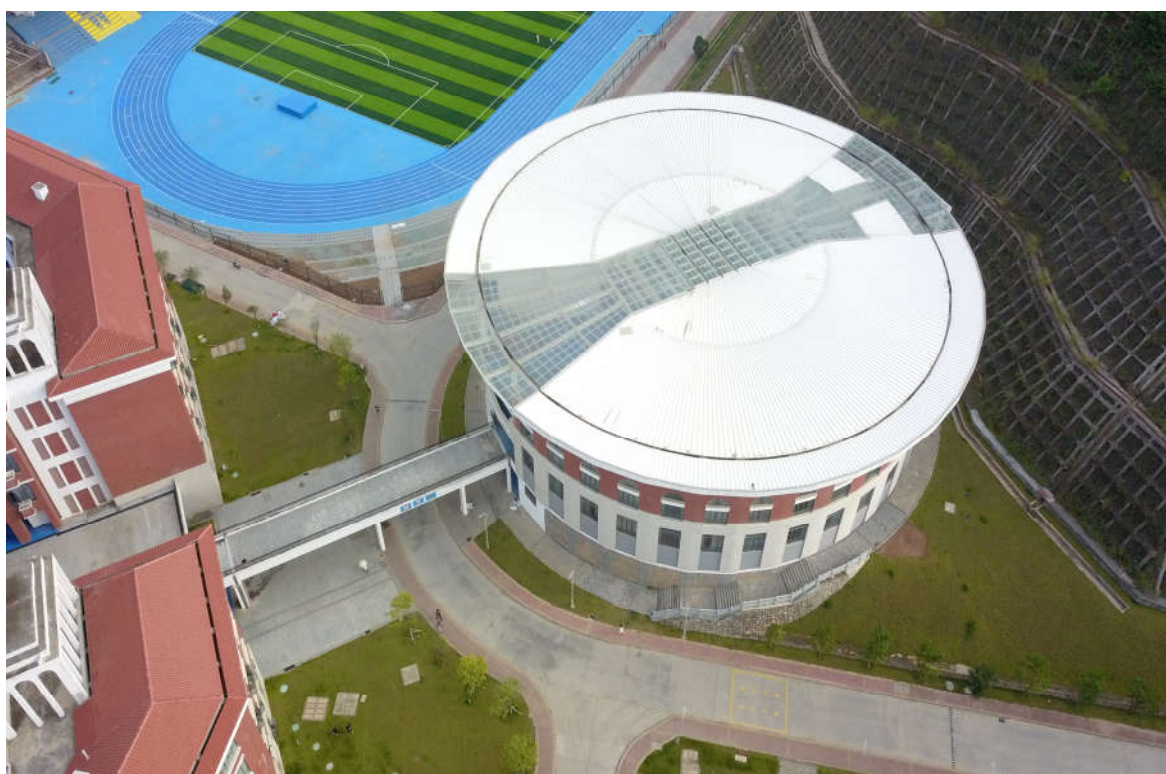

(二期 1#阶梯教室施工鸟瞰图)





（三期 7#职业培训楼施工鸟瞰图）



（三期室外运动场及体育看台的施工鸟瞰图）

3. 截止 2023 年 12 月 31 日，本项目累计完成建安产值约 5.82 亿元，已付承包方工程进度款约 4.745 亿元（包含设计费 10108620 元）。

## （二）光华片区项目进展情况

### 1. 光华片区市政工程

本月，光华片区市政工程完成了西边围墙的砌筑和批灰，铺设道路水泥稳定碎石，现场排水管道的开挖及安装，保安室基础开挖等工作；教师公租房东侧挡土墙的砌筑完成80%，路缘石铺设完成10%，正在开展水稳层的铺设。



（光华市政工程施工现场）
